GEMEENTE TYNAARLO HERINRICHTING BORCHSINGEL - CONCEPT PLANNING

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Duur
1	***OMGEVINGSMANAGEMENT***	***woe 11-12-24***	***woe 11-12-24***	***1 dag***
2	Inloopavond omgeving	woe 11-12-24	woe 11-12-24	1 dag
3				
4	***UITVOERING***	***maa 13-1-25***	***vri 2-5-25***	***83 dagen***
5	Inrichten bouwterrein en keten etc.	maa 13-1-25	vri 17-1-25	5 dagen
6	***Fase 1 - Werkzaamheden zuidzijde***	***maa 20-1-25***	***vri 21-2-25***	***25 dagen***
7	Plaatsen verkeersmaatregelen	maa 20-1-25	maa 20-1-25	1 dag
8	Maaien en frezen terrein	din 21-1-25	din 21-1-25	1 dag
9	Grondwerk incl. dempen deel vijver	woe 22-1-25	din 11-2-25	15 dagen
10	Rioolwerk	don 30-1-25	don 6-2-25	6 dagen
11	Fundering werkzaamheden	woe 12-2-25	din 18-2-25	5 dagen
12	Werkzaamheden tijdelijke rijbaan	woe 19-2-25	don 20-2-25	2 dagen
13	Plaatsen verkeersmaatregelen tbv fase 2	vri 21-2-25	vri 21-2-25	1 dag
14				
15	***Fase 2 - Werkzaamheden Noordzijde***	***maa 24-2-25***	***zat 22-3-25***	***21 dagen***
16	Opbreken/frezen bestaande verhardingen	maa 24-2-25	don 27-2-25	4 dagen
17	Grondwerk	woe 26-2-25	din 4-3-25	5 dagen
18	Rioolwerk	vri 28-2-25	woe 5-3-25	4 dagen
19	Fundering werkzaamheden	din 4-3-25	din 11-3-25	6 dagen
20	Straatwerkzaamheden	maa 10-3-25	woe 19-3-25	8 dagen
21	Asfalt	don 20-3-25	zat 22-3-25	2 dagen
22	Aanwerken bermen / buffer	zat 22-3-25	zat 22-3-25	1 dag
23	Plaatsen omleiding tbv afsluiting	zat 22-3-25	zat 22-3-25	1 dag
24				
25	***Fase 3 - Weekend afsluiting***	***zat 22-3-25***	***maa 24-3-25***	***5 dagen***
26	Afsluiten werkvak	zat 22-3-25	zat 22-3-25	1 dag
27	Opbreken/frezen bestaande verhardingen	zat 22-3-25	zat 22-3-25	1 dag
28	Grondwerk	zat 22-3-25	zat 22-3-25	1 dag
29	Rioolwerk	zat 22-3-25	zat 22-3-25	1 dag
30	Fundering werkzaamheden	zat 22-3-25	zon 23-3-25	1 dag
31	Straatwerkzaamheden	zon 23-3-25	zon 23-3-25	1 dag
32	Asfalt	zon 23-3-25	zon 23-3-25	1 dag
33	Plaatsen verkeersmaatregelen tbv fase 2	zon 23-3-25	maa 24-3-25	1 dag
34				
35	***Fase 4 - Werkzaamheden zuidzijde - definitieve inrichting***	***maa 24-3-25***	***vri 2-5-25***	***27 dagen***
36	Opbreken tijdelijke rijbaan	maa 24-3-25	don 27-3-25	3 dagen
37	Grondwerk	don 27-3-25	maa 31-3-25	2 dagen
38	Rioolwerk	maa 31-3-25	din 8-4-25	5 dagen
39	Fundering/zandbaan werkzaamheden	din 8-4-25	din 15-4-25	5 dagen
40	Straatwerkzaamheden	woe 9-4-25	don 1-5-25	15 dagen
41	Aanwerken bermen / buffer	don 1-5-25	vri 2-5-25	1 dag

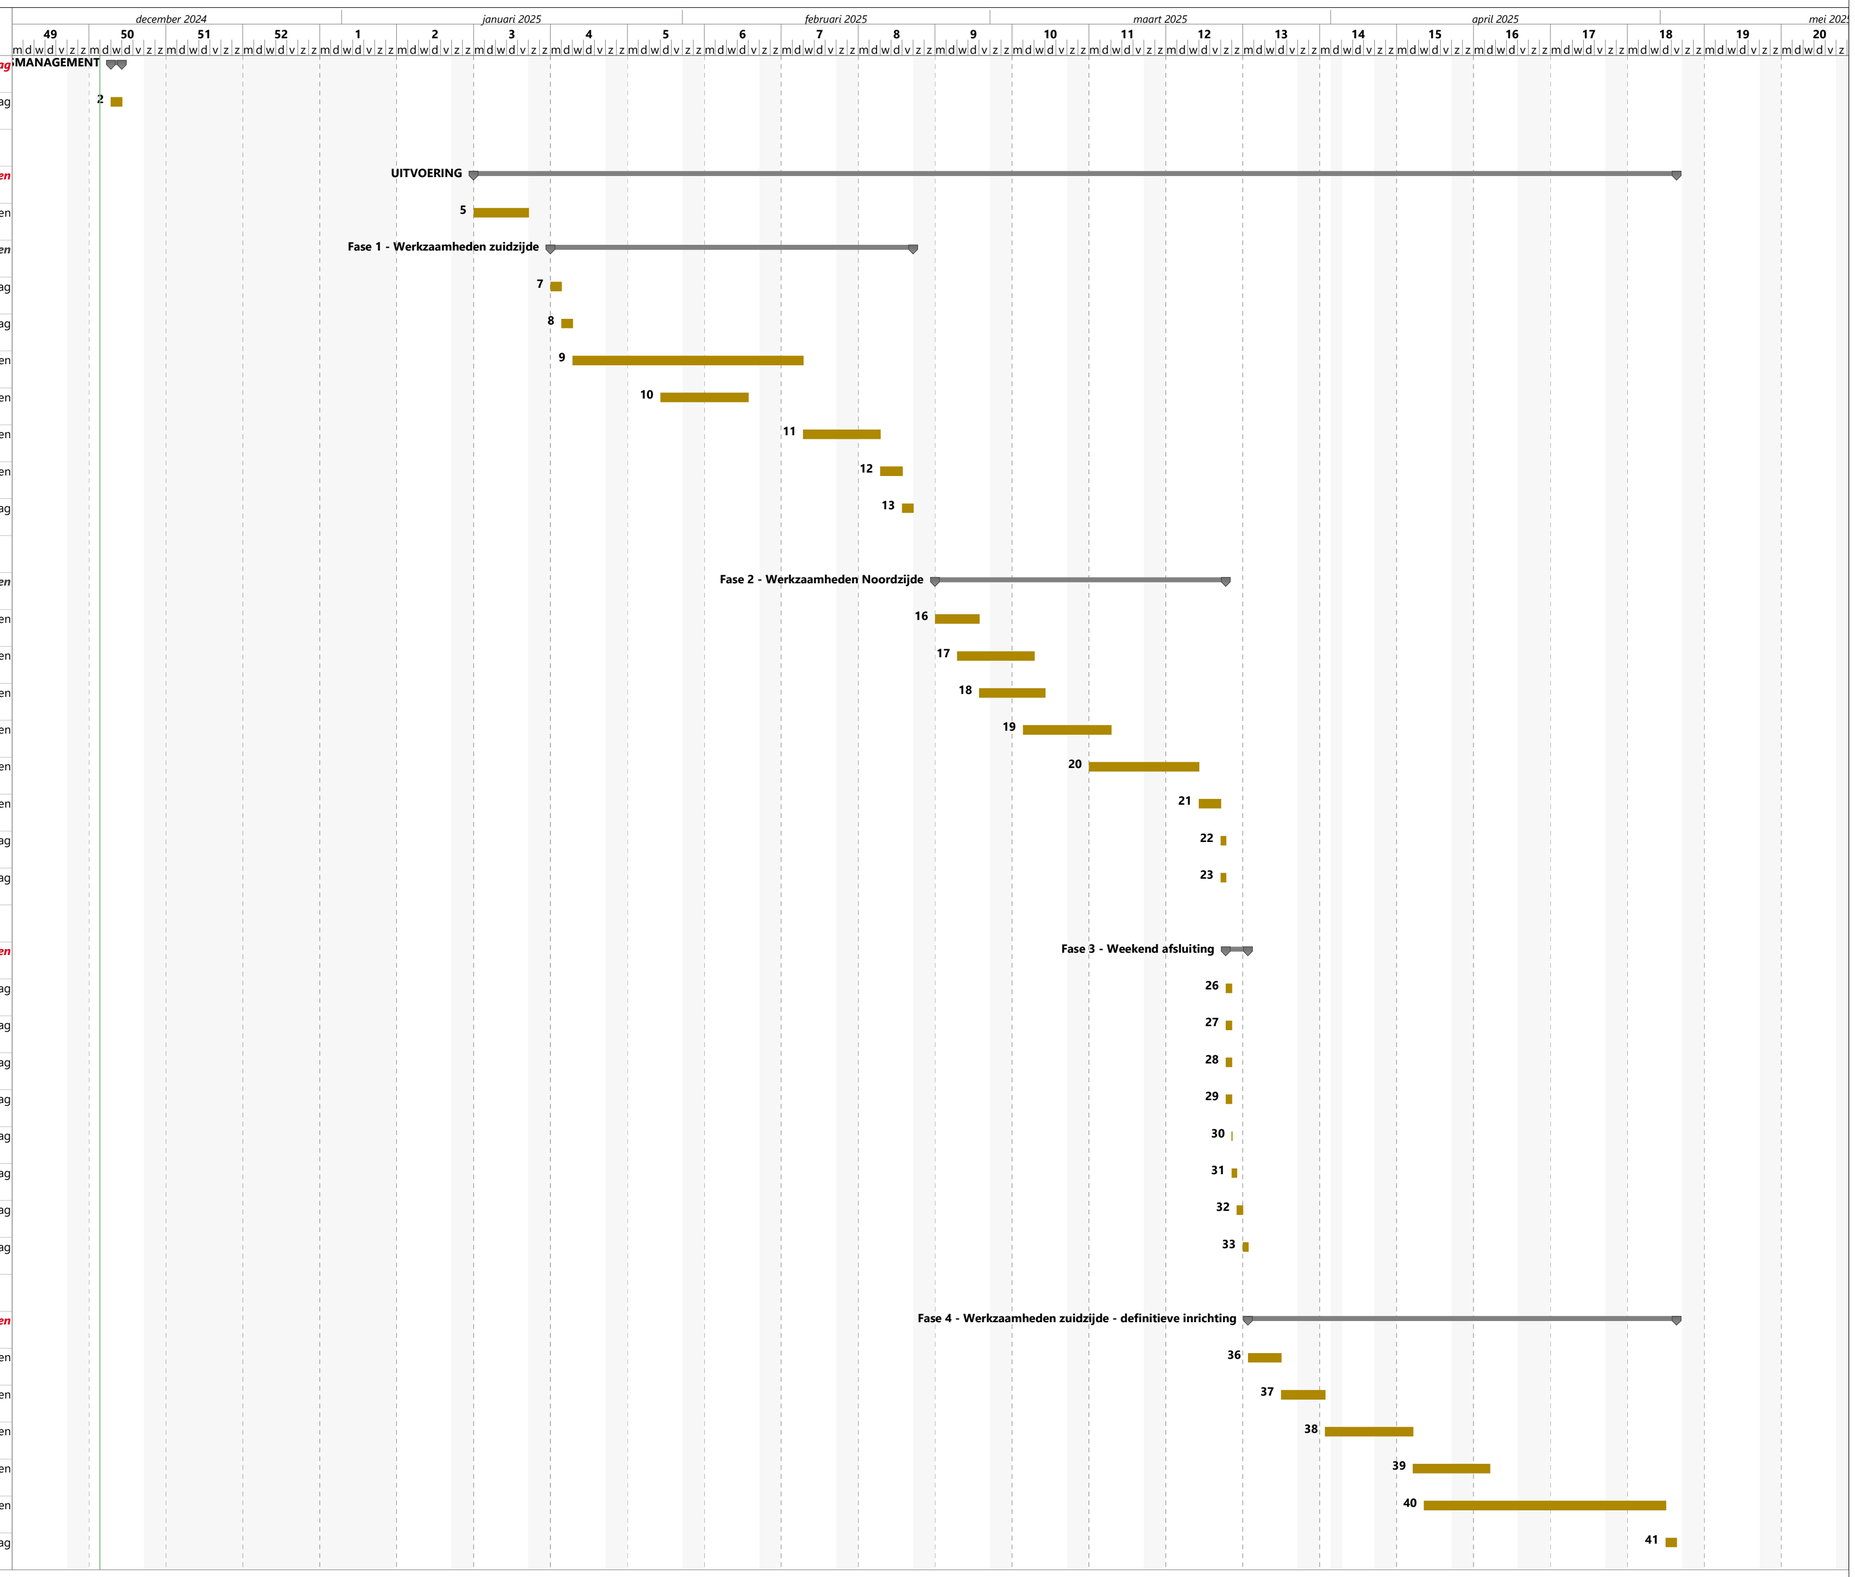

Datum: din 10-12-24

Roelofs | Gemeente Tynaarlo | Derden | Overleg | Mijlpaal | Samenvatting | Voortgang | Gereed | Deadline
