

FASERINGSPLAN HERINRICHTING BORCHSINGEL

Projectnaam: Herinrichting Borchsingel

Nummer: 24-05-W

Status: Definitief/01

Datum: 10 december 2024



Werkzaamheden



Bereikbaarheidsmaatregel




Veiligheidsmaatregel

gemeente Tynaarlo



FASE 1 | REALISEREN BYPASS EN FIETSOVERSTEEK ZWEERDENEILAND

13 januari '25 - 21 februari '25

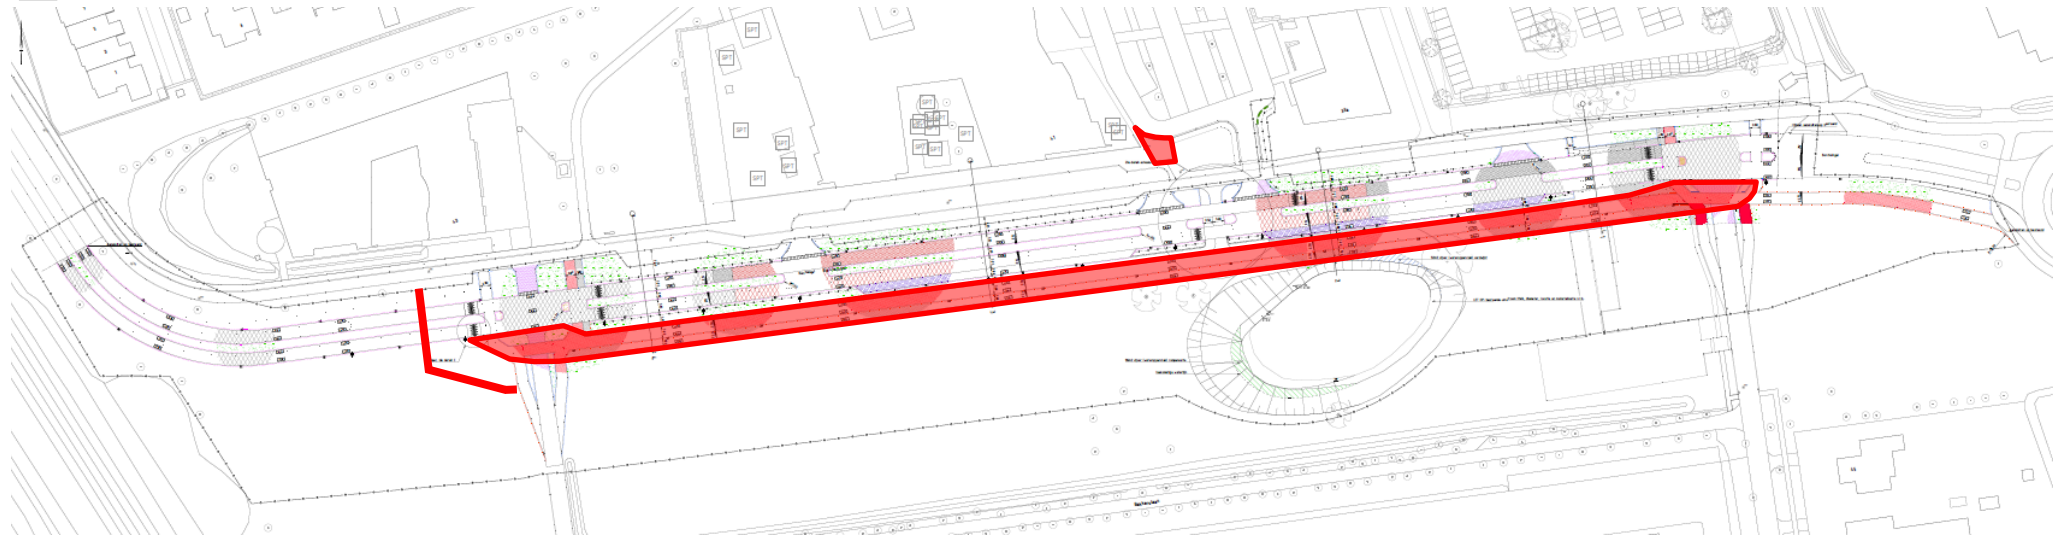

- Oprooiwerkzaamheden berm zuidzijde rijbaan Borchsingel.
- Aanbrengen bypass zuidzijde Borchsingel.
- Werkzaamheden kruisingn Zweerdeneiland en Bakkerslaan t.b.v. aanbrengen bypass.
- Aanbrengen tijdelijke fietsoversteek ter hoogte van de kruising Zweerdeneiland.
- Aanbrengen doorsteek parkeerplaats + kiss en ride strook.




- Borchsingel blijft bereikbaar voor doorgaand autoverkeer volgens de bestaande situatie.
- Borchsingel blijft bereikbaar voor doorgaand fietsverkeer volgens de bestaande situatie.
- In- en uitritten scholen, gezondheidscentrum, supermarkt en gezinskliniek blijven in deze fase in gebruik.
- Woonwijk Waterwijk blijft bereikbaar via de zuidelijke entree (Woltsingel-Groningerweg).



- Inrit Bakkerslaan afgesloten voor verkeer. Fietsers via het fietspad Bakkerslaan parallel aan de Borchsingel en door de Zweerdeneiland naar tijdelijke oversteek ter hoogte van kruising Zweerdeneiland-Borchsingel.
- Aan- en afvoer materiaal en materieel zoveel mogelijk buiten de schooltijden om.
- Tijdelijke fietsoversteek zodat schoolgaande kinderen veilig de Borchsingel kunnen oversteken. (Rode lijn kruising Zweerdeneiland-Borchsingel)
- De klaar-overs helpen mee om de kinderen veilig over te laten steken bij de tijdelijke fietsoversteek.

FASE 3 | REALISEREN NIEUWE BOCHTEN WESTZIJDE BORCHSINGEL, AANSLUITING ZWEERDENEILAND EN BAKKERSLAAN EN INRITTEN

21 maart '25 - 24 maart '25

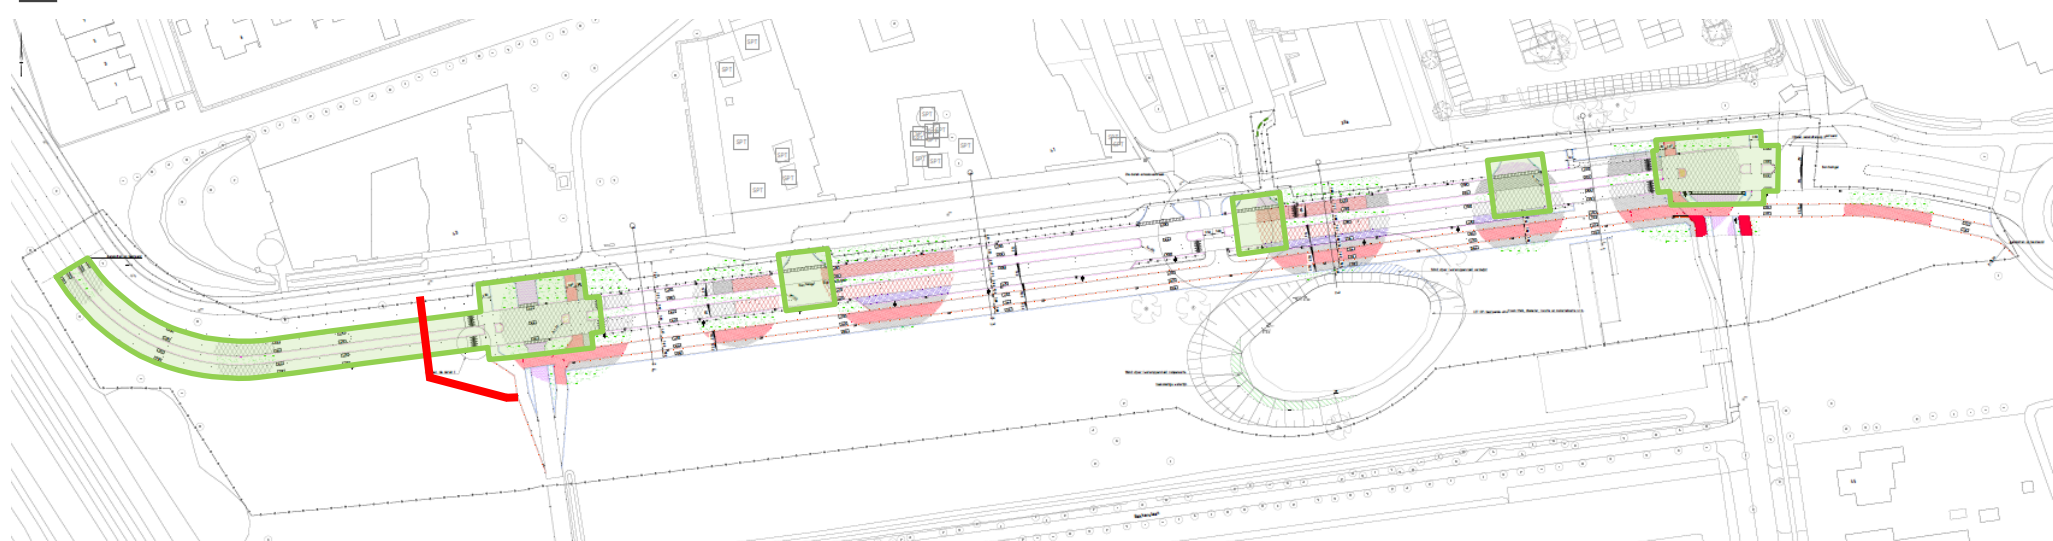

- Opbreken bestaande situatie (Groen gearceerde deel van de Borchsingel).
- Aanpassen bochten westzijde Borchsingel.
- Reconstrueren kruisingn Zweerdeneiland - Borchsingel.
- Reconstrueren Bakkerslaan - Borchsingel.
- Reconstrueren in- en uitrit parkeerplaats.
- Reconstrueren in- en uitrit kiss en ride strook.
- Reconstrueren inrit supermarkt terrein.




- Borchsingel tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Doorgaand verkeer wordt via de Paterswoldseweg - Laan Corpus Den Hoorn en N7 /A7 omgeleid.
- De inritten aan de noordzijde van de Borchsingel zijn afgesloten.
- Supermarkt blijft bereikbaar voor klanten via inrit Ter Borchlaan.
- Fiets- en voetgangers omgeleid over fietspad Groningerweg of fietspad parallel aan de Borchsingel (Bakkerslaan).
- Woonwijk Waterwijk blijft bereikbaar via de zuidelijke entree (Woltsingel-Groningerweg).



- Inrit Bakkerslaan en Zweerdeneiland afgesloten voor verkeer. Fietsers via het fietspad Bakkerslaan parallel aan de Borchsingel en via de Groningerstraat omgeleid.
- Werkzaamheden vinden in een totale afsluiting plaats, waardoor voorkomt dat er kruisende verkeersstromen ontstaan en daarmee onveilige situaties. Hierdoor kunnen de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden.

FASE 2 | REALISEREN NIEUWE SITUATIE TUSSEN KRUISSING ZWEERDENEILAND EN BAKKERSLAAN MET UITZONDERING VAN INRITTEN

24 februari '25 - 21 maart '25

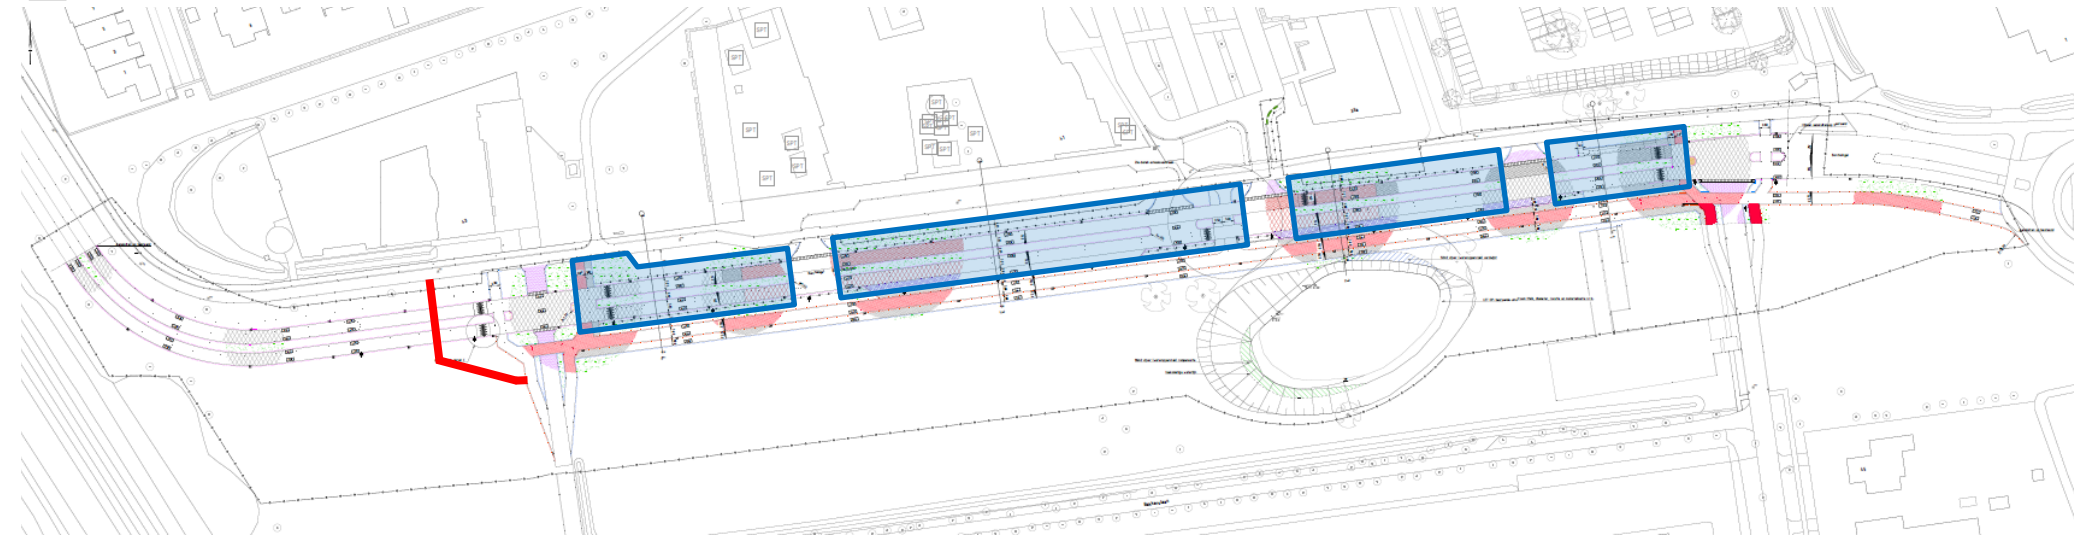

- Oprooiwerkzaamheden bestaande inrichting Borchsingel (Blauw gearceerde deel van de Borchsingel).
- Realiseren nieuwe situatie Borchsingel (Blauw gearceerde deel van de Borchsingel).




- Borchsingel blijft bereikbaar voor doorgaand autoverkeer via de bypass aangebracht in fase 1 (zie hiervoor fase 1).
- Borchsingel blijft bereikbaar voor doorgaand fietsverkeer volgens de bestaande situatie aan de noordzijde.
- Scholen, gezondheidscentrum, supermarkt en gezinskliniek blijven in deze fase middels doorsteken in door het werkvak bereikbaar.
- Woonwijk Waterwijk blijft bereikbaar via de zuidelijke entree (Woltsingel-Groningerweg).



- Inrit Bakkerslaan afgesloten voor verkeer. Fietsers via het fietspad Bakkerslaan parallel aan de Borchsingel en door de Zweerdeneiland naar tijdelijke oversteek ter hoogte van kruising Zweerdeneiland-Borchsingel.
- Aan- en afvoer materiaal en materieel zoveel mogelijk buiten de schooltijden om.
- Tijdelijke fietsoversteek zodat schoolgaande kinderen veilig de Borchsingel kunnen oversteken. (Rode lijn kruising Zweerdeneiland-Borchsingel)
- De klaar-overs helpen kinderen mee met veilig over te laten steken bij de tijdelijke fietsoversteek.

FASE 4 | AANBRENGEN FIETS-/VOETPAD EN KISS EN RIDE STROOK ZUIDZIJDE BORCHSINGEL EN OVERIGE WERKZAAMHEDEN NOORDZIJDE

24 maart '25 - 2 mei '25

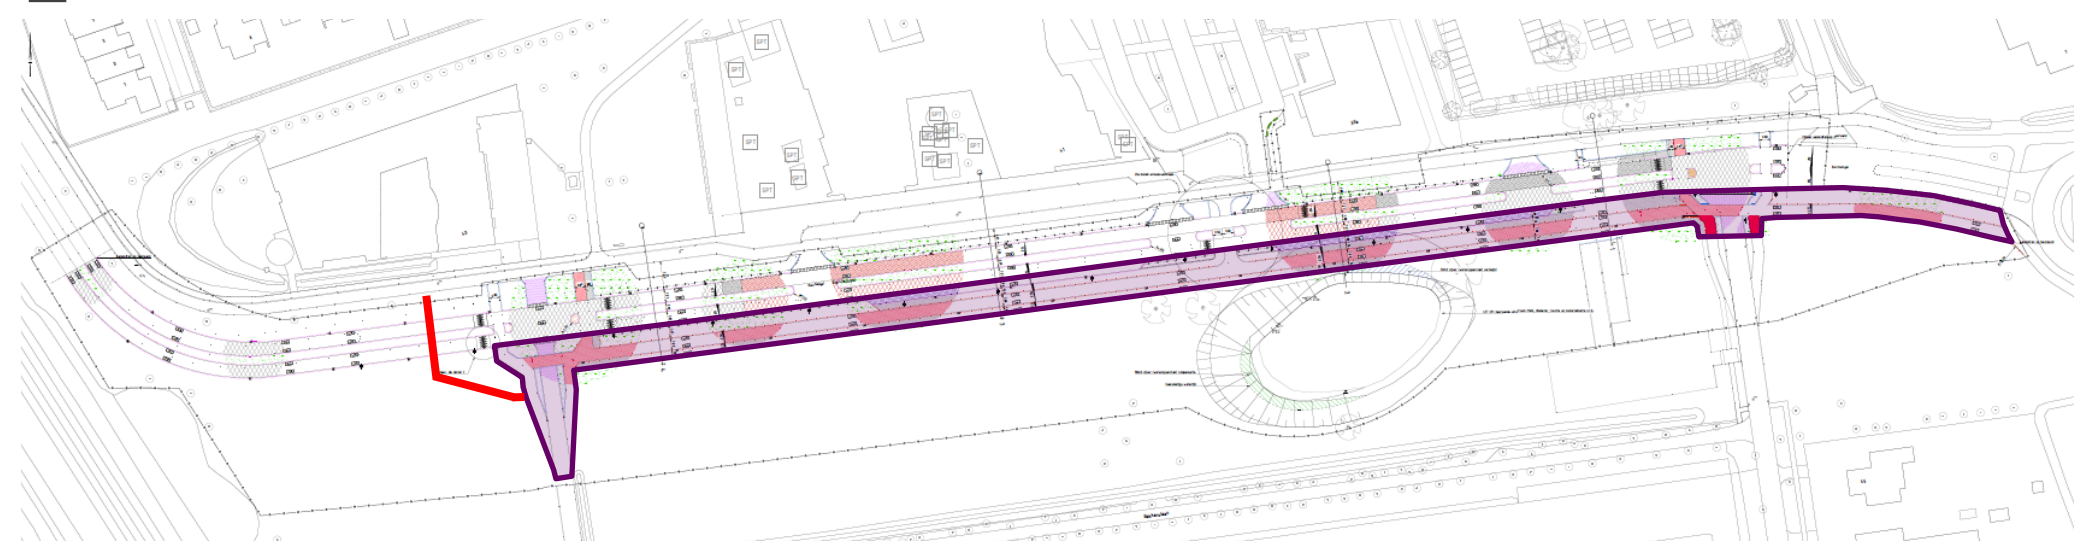

- Opbreken tijdelijke bypass.
- Aanbrengen straatwerk kiss+ride strook zuidzijde Borchsingel.
- Aanbrengen straatwerk voetpaden zuidzijde Borchsingel.
- Aanbrengen straatwerk fietspad zuidzijde Borchsingel.
- Reconstrueren inritten Zweerdeneiland en Bakkerslaan.
- Afwerken bermen.
- Diverse kleine opleverwerkzaamheden gehele projectgebied.



- Borchsingel is bereikbaar voor doorgaand autoverkeer volgens de nieuwe situatie.
- Borchsingel blijft bereikbaar voor doorgaand fietsverkeer volgens de bestaande situatie aan de noordzijde.
- Scholen, gezondheidscentrum, supermarkt en gezinskliniek zijn bereikbaar volgens de nieuwe situatie.
- Woonwijk Waterwijk blijft bereikbaar via de zuidelijke entree (Woltsingel-Groningerweg).



- Inrit Bakkerslaan blijft afgesloten t.b.v. afschermen ketenpark en verkeer. Fietsers gaan via tijdelijke fietsoversteek ter hoogte van kruising Zweerdeneiland.
- Aan- en afvoer materiaal en materieel zoveel mogelijk buiten de schooltijden om.
- De klaar-overs helpen mee om de kinderen veilig over te laten steken bij de tijdelijke fietsoversteek.
- Verkeer maakt gebruik van de nieuwe rijbaan en daarmee zijn de verkeer en werkzaamheden gescheiden van elkaar.
